



Chomutov

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Projekt:</b>    | Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Ctiborova, Vodní a přilehlých prostor ve městě Chomutov |   |
| <b>Objednatel:</b> | Statutární město Chomutov  |   |
| <b>Předmět:</b>    | Pokyn k provedení změny (PPZ)  | 1 |

**Komu:** ABC Chomutov spol. s r.o. **Od** Statutárnímu městu Chomutov

**Stavební Objekt:** ulice Dukelská , ul Ctiborova

**Předmět změny:**

**Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla.**

V zadávací projektové dokumentaci chybí detailní výpočet osvětlení pro celou stavbu. Je zde jen vzorová část na 30m vzdálenosti mezi dvěma lampami.

Na základě objednání svítidel , byl výrobcem dodán detailní výpočet osvětlení na celou stavbu.

Výpočet osvětlení vytvořený společností SATHEA VISION s.r.o. doplňuje chybějící body osvětlení a to v počtu 8 ks, ve třech lokalitách stavby

Lokalita č.1 - Žižka - doplnění 2 ks lamp , kolize se stávajícím betonovým základem (1,2 m3) a betonovým krytem s podkladním ložem s kameniva (7,5m2)- viz grafická část

Lokalita č.2 - ul. Ctiborova - doplnění 1 ks lampy - viz grafická část

Lokalita č.3 - ul. Dukelská - Veterinární klinika - doplnění 5 ks lamp , kolize se stávajícím betonovým základem (2,7 m3) a betonovým krytem s podkladním ložem s kameniva (37,7 m2)- viz grafická část

**Žádost o změnu vznesl:** Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu

**Odkazy na výkresy :** Oznámení zhotovitele o včasném varování ze dne 30.11.2022  
Oznámení o claimu na dodatečnou platbu ze dne 28.12.2022

**Důvod změny:** změny v průběhu stavby v podobě Variace a pokynu zástupce objednatele

**Časové ohodnocení:** od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Zástupcem zhotovitele byl předložen nový návrh - doloženo zákresem (viz. "výkresy").

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):**

|          | <b>Cena</b>   |
|----------|---------------|
| Odpočty  | 0,00 Kč       |
| Připočty | 350 062,82 Kč |

**Celkové předpokládané náklady**

**Cena**  
350 062,82 Kč

**Zhotovitel:**

Jan Vaněk

**Objednatel:**

David Dinda - náměstek primátora

Mgr. Hana Nováková - vedoucí OF

**Datum a podpis:**

16.1.2023

**Datum a podpis:**

*Právce stavby: Ing. Petr Miško*

**Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací**



|             |  |  |   |
|-------------|--|--|---|
| Projekt:    | Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Ctiborova, Vodní a přílehlých prostor ve městě Chomutov |  |   |
| Objednatel: | Statutární město Chomutov  |  |   |
| Předmět:    | Oznámení možné změny (OMZ)   |  | 1 |

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: ABC Chomutov spol. s r.o.

Stavební Objekt: ulice Dukelská , ul Ctiborova

**Předmět změny:**  
**Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla.**  
V zadávací projektové dokumentaci chybí detailní výpočet osvětlení pro celou stavbu. Je zde jen vzorová část na 30m vzdálenosti mezi dvěma lampami.  
Na základě objednání svítidel , byl výrobcem dodán detailní výpočet osvětlení na celou stavbu.  
Výpočet osvětlení vytvořený společností SATHEA VISION s.r.o. doplňuje chybějící body osvětlení a to v počtu 8 ks, ve třech lokalitách stavby  
Lokalita č.1 - Žižka - doplnění 2 ks lamp , kolize se stávajícím betonovým základem (1,2 m3) a betonovým krytem s podkladním ložem s kameniva (7,5m2)- viz grafická část  
Lokalita č.2 - ul. Ctiborova - doplnění 1 ks lampy - viz grafická část  
Lokalita č.3 - ul. Dukelská - Veterinární klinika - doplnění 5 ks lamp , kolize se stávajícím betonovým základem (2,7 m3) a betonovým krytem s podkladním ložem s kameniva (37,7 m2)- viz grafická část

**Žádost o změnu vznesl:** Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu

**Odkazy na výkresy :** Oznámení zhotovitele o včasném varování ze dne 30.11.2022  
Oznámení o claimu na dodatečnou platbu ze dne 28.12.2022

**Důvod změny:** změny v průběhu stavby v podobě Variace a pokynu zástupce objednatele

**Časové ohodnocení:** od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**


Vyčíslení změny bude doloženo po zaměření skutečných ploch na místě stavby. Finanční objem bude následně doplněn.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):</b> | <b>Cena</b>   |
| Odpočty   | 0,00 Kč       |
| Přípočty  | 350 062,82 Kč |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Celkové předpokládané náklady</b> | <b>Cena</b>   |
|                                      | 350 062,82 Kč |

|                                      |                                 |  |                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------|
| Oznámil za zhotovitele:<br>Jan Vaněk | Schválil za správce stavby:<br> | Převzal za Objednatele:<br>Mgr.Hana Nováková | Pavel Melichar  |
| Datum a podpis: 16.1.2023            | Datum a podpis:                 | Datum a podpis: 16.1.2023                    | Datum a podpis: |

**Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.**

|   |   |  |                           |
|---|---|--|---------------------------|
|    | <b>ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ</b>  |  |                           |
|   | <b>Název stavby:</b>  | Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Ctiborova, Vodní a přilehlých prostor ve městě Chomutov, ev.č. d202200418 |                           |
|   | <b>Číslo Změnového listu:</b>   | ZL 1   |                           |
|   | <b>Číslo SO/PS:</b>   |  |                           |
| <b>Název stavebního objektu/provozního souboru:</b>   | ulice Dukelská , ul Ctiborova   |  |                           |
| <b>Objednatel:</b>  | STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  | <b>Zhotovitel:</b>   | ABC Chomutov spol. s r.o. |
| <b>Předmět změny:</b>   | Stožáry a lampy   |  |                           |
| <b>Iniciátor změny:</b>   | Zhotovitel/Objednatel   |  |                           |
| <b>Popis změny:</b><br>(popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100) | <p>předmětem projednávané změny , je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla. V zadávací projektové dokumentaci chybí detailní výpočet osvětlení. Je zde jen vzorová část na 30 m vzdálenosti mezi dvěma lampami. Na základě objednávky svítidel, byl výrobcem dodán výpočet osvětlení na celou stavbu. Výpočet osvětlení vytvořený společností SATHEA VISION s.r.o. doplňuje chybějící body osvětlení a to v počtu 8ks ve třech lokalitách.</p> <p>Lokalita č.1 – Žižka – doplnění 2 ks lamp, kolize se stávajícím betonovým základem (1,2 m3) a betonovým krytem s podkladním ložem z kameniva (7,5 m2).</p> <p>Lokalita č.2 – ul. Ctiborova – doplnění 1 ks lampy.</p> <p>Lokalita č.3 – ul. Dukelská – Veterinární klinika – doplnění 5 ks lamp, kolize se stávajícím betonovým základem (2,7 m3) a betonovým krytem s podkladním ložem z kameniva (37,7 m2).</p> |  |                           |
| <b>Odkazy na výkresy:</b>   | <b>Dopad do celkových termínů:</b>  | NE   |                           |
| Viz. přílohy Změnového listu  | Původní termín dle SOD:   | 6.6.2023   |                           |
|   | Termín dle ZL. č.   |  |                           |
|   | Nový termín:  |  |                           |
| <b>NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):</b>   | Odpočty v Kč bez DPH  | 0,00 Kč  |                           |
| viz. příloha ZL   | Přípočty v Kč bez DPH   | 350 062,82 Kč  |                           |
|   | <b>Celkem bez DPH</b>   | <b>350 062,82 Kč</b>   |                           |
|   | DPH   | 73 513,19 Kč   |                           |
|   | <b>Celkem včetně DPH</b>  | <b>423 576,01 Kč</b>   |                           |
|   | <b>Jméno:</b>   | <b>Datum:</b>  | <b>Podpis:</b>            |
| <b>Zástupce objednatele:</b>  | Ing.Petr Miško  | 18.1.2023  |                           |
| <b>Autorský dozor:</b>  | Libor Slavík  | 16.1.2023  |                           |
| <b>Objednatel:</b><br>osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-El. 3.1 OP/ZP  | David Dinda   | 16.1.2023  |                           |
|   | Mgr. Hana Nováková  | 16.1.2023  |                           |
| <b>Zhotovitel:</b>  | Jan Vaněk   | 16.01.2023   |                           |
| <b>Přílohy změnového listu:</b>   | Oznámení včasného varování ze dne 30.11.2022  |  |                           |
|   | Oznámení správce stavby ze dne 14.12.2022   |  |                           |
|   | Oznámení o claimu na dodatečnou cenu ze dne 28.12.2022  |  |                           |
|   | Oznámení správce stavby ze dne 11.1.2023  |  |                           |
|   | Oznámení možné změny ze dne 16.1.2023   |  |                           |
|   | Pokyn k provedení změny   |  |                           |
|   | Grafické znázornění a popis změn  |  |                           |
|   | Položkový rozpočet změn   |  |                           |
|   | Vyjádření autorského dozoru projektanta   |  |                           |
|   | Dohoda o rozsahu claimu   |  |                           |

# DOHODA O ROZSAHU CLAIMU

Číslo/označení Smlouvy: d202200418

Zhotovitel: ABC Chomutov spol. s r.o.  
Škroupova 1059  
430 01 Chomutov  
IČO: 44566760

Zástupce objednatele/správce stavby: Ing.Petr Miško, správce stavby  
Boženy Němcové 365  
431 51 Klášterec nad Ohří  
IČO: 08166234

Objednatel: Statutární město Chomutov  
Zborovská 4602  
430 28 Chomutov  
IČO: 00261891

Datum: 16.1.2023

Vážený,

v návaznosti na podané Oznámení claimu na změnu v počtu stožárů a svítidel, sděluji, že nárok byl posouzen s řádnou odbornou péčí, s ohledem na Smlouvu a na veškeré relevantní okolnosti předloženého claimu a je považován za **oprávněný**.

Touto „Dohodou“ se schvaluje nárok v plném rozsahu.

Původní cena: 13 257 416,94 Kč bez DPH

Navýšení: 350 062,82 Kč bez DPH

Celková cena: 13 607 479,76 Kč bez DPH

.....  
Ing. Petr Miško, Správce stavby

Za ostatní strany:

.....  
ABC spol. s r.o.

Jan Vaněk, Zástupce zhotovitele



.....  
Statutární město Chomutov

Mgr. Hana Nováková, Vedoucí Odboru rozvoje a investic

.....  
Statutární město Chomutov

David Dinda, 1.náměstek primátora



*Příloha: Oznámení claimu na „stožáry a lampy“ ze dne 30.11.2022 a oznámení o Claimu na dodatečnou platbu ze dne 28.12.2022*

# OZNÁMENÍ VČASNÉHO VAROVÁNÍ

## Stožáry a lampy

Pro stavbu: **Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Ctiborova, Vodní a přilehlých prostor ve městě Chomutov**

Objednatel: **Statutární město Chomutov**

*Škroupova 1059/22 , 430 01 Chomutov*

*IČO: 00261891*

Zhotovitel: **ABC Chomutov spol. s r.o.**

*Jednatel – Jan Vaněk*

*Škroupova 1059/22 , 430 01 Chomutov*

*IČO: 44566760*

Číslo/označení Smlouvy: d202200418

Adresováno: Ing. Petr Miško

Vážení,

v návaznosti na bod 6.1. Obecních smluvních podmínek tímto upozorňujeme na okolnosti, které mohou zvýšit smluvní cenu, zpozdit provádění díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo následného provozování. Zároveň upozorňujeme, že na základě těchto okolností dojde pravděpodobně k uplatnění claimu, a to v souladu s čl 6. Obecních smluvních podmínek.

Popis okolností: Před zahájením elektromontážních prací byl proveden výrobcem svítidel detailní výpočet osvětlení .Na základě skutečného umístění v terénu (kolize sítí, vstupů a vjezdů do objektů) dochází k drobným úpravám pozic stožárů,jejich počtu a svítidel.

Výpočet provedla firma SATHEA VISION s.r.o. IČO 241 84 780, po konzultaci s projektantem Ing. Slavíkem

V Chomutově dne: 30.11.2022



.....

✓ Jan Vaněk, jednatel společnosti ABC Chomutov spol. s r.o.

**Statutární město Chomutov**  
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
Ing. Petr Miško, správce stavby

**ABC Chomutov spol. s r.o.**  
Škroupova 1059, 430 01 Chomutov  
Jan Vaněk, jednatel

Akce: Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Ctiborova,  
Vodní a přilehlých prostor ve městě Chomutov

## **OZNÁMENÍ SPRÁVCE STAVBY**

Vážení,

jako Správce stavby Vám dle Pod-čl. 6.2 a 6.5 OSP/ZSP oznamuji, že jsem přijal Vaše Oznámení včasného varování ze dne 30.11.2022, které se týká úprav pozic stožárů, jejich počtu a svítidel.

Vyzývám Vás tímto k předání Oznámení Claimu a k určení případné časové a finanční kompenzace.

V Klášterci nad Ohří, dne 14.12.2022

.....  
Ing. Petr Miško  
Správce stavby

# OZNÁMENÍ CLAIMU NA DODATEČNOU CENU

## Stožáry a lampy

Pro stavbu: **Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Ctiborova, Vodní a přilehlých prostor ve městě Chomutov**

Objednatel: **Statutární město Chomutov**

*Škroupova 1059/22 , 430 01 Chomutov*

*IČO: 00261891*

Zhotovitel: **ABC Chomutov spol. s r.o.**

*Jednatel – Jan Vaněk*

*Škroupova 1059/22 , 430 01 Chomutov*

*IČO: 44566760*

Číslo/označení Smlouvy: d202200418

Adresováno: Ing. Petr Miško

Vážení,

v návaznosti na bod 6.1. Obecních smluvních podmínek tímto upozorňujeme na okolnosti, které mohou zvýšit smluvní cenu, zpozdit provádění díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo následného provozování. Zároveň upozorňujeme, že na základě těchto okolností dojde pravděpodobně k uplatnění claimu, a to v souladu s čl 6. Obecních smluvních podmínek.

Popis okolností: předmětem projednávané změny , je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla. V zadávací projektové dokumentaci chybí detailní výpočet osvětlení. Je zde jen vzorová část na 30 m vzdálenosti mezi dvěma lampami. Na základě objednání svítidel, byl výrobcem dodán výpočet osvětlení na celou stavbu. Výpočet osvětlení vytvořený společností SATHEA VISION s.r.o. doplňuje chybějící body osvětlení a to v počtu 8ks ve třech lokalitách.

Lokalita č.1 – Žižka – doplnění 2 ks lamp, kolize se stávajícím betonovým základem (1,2 m3) a betonovým krytem s podkladním ložem z kameniva (7,5 m2).

Lokalita č.2 – ul. Ctiborova – doplnění 1 ks lampy.

Lokalita č.3 – ul. Dukelská – Veterinární klinika – doplnění 5 ks lamp, kolize se stávajícím betonovým základem (2,7 m3) a betonovým krytem s podkladním ložem z kameniva (37,7 m2).

Položky vyvolané touto změnou:            navýšení ceny díla

V Chomutově dne: 28.12.2022

.....



ABC Chomutov, spol. s r.o. (IČ)  
430 01 Chomutov, Škroupova 1059

✓ Jan Vanek, jednatel společnosti ABC Chomutov spol. s r.o.



**Statutární město Chomutov**  
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
Ing. Petr Miško, správce stavby

**ABC Chomutov spol. s r.o.**  
Škroupova 1059, 430 01 Chomutov  
Jan Vaněk, jednatel

Akce: Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Ctiborova,  
Vodní a přilehlých prostor ve městě Chomutov

## **OZNÁMENÍ SPRÁVCE STAVBY**

Vážení,

jako Správce stavby Vám dle Pod-čl. 6.2 a 6.5 OSP/ZSP oznamuji, že jsem přijal Vaše Oznámení Claimu ze dne 28.12.2022, které se týká úprav pozic stožárů, jejich počtu a svítidel. Oznámení bylo předáno řádně a včas v souladu s čl. 6.2 OSP.

Dále Vám oznamuji, že jsem posoudil podstatu Claimu jako oprávněnou a to z důvodu chybného zadání, resp. chyby v zadávací projektové dokumentaci. Předložený výpočet osvětlení Zhotovitele vytvořený spol. SATHEA VISION s.r.o. tuto chybu napravuje.

Žádám Vás tímto o podrobné vyčíslení Claimu v souladu s čl. 6.3 a 6.4 OSP.

Upozorňuji, že v souladu s čl. 6.2 OSP musíte po pominutí okolností zakládající Claim předložit do 14 dnů Oznámením podrobné závěrečné vyčíslení Claimu.

V Klášterci nad Ohří, dne 11.01.2023

.....  
Ing. Petr Miško  
Správce stavby


# DOKUMENTACE


popis změny - viz list OZ1

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI PROVEDENY VÝSTŘÍŽKEM Z CELKOVÉ SITUACE

Lokalita č.1 Žižka 2 ks lamp

důvod změny: Chybějící světelný bod, kolize se stávajícím betonovým základem (1,2 m3) a betonovým krytem s podkladním ložem z kameniva (7,5 m2)

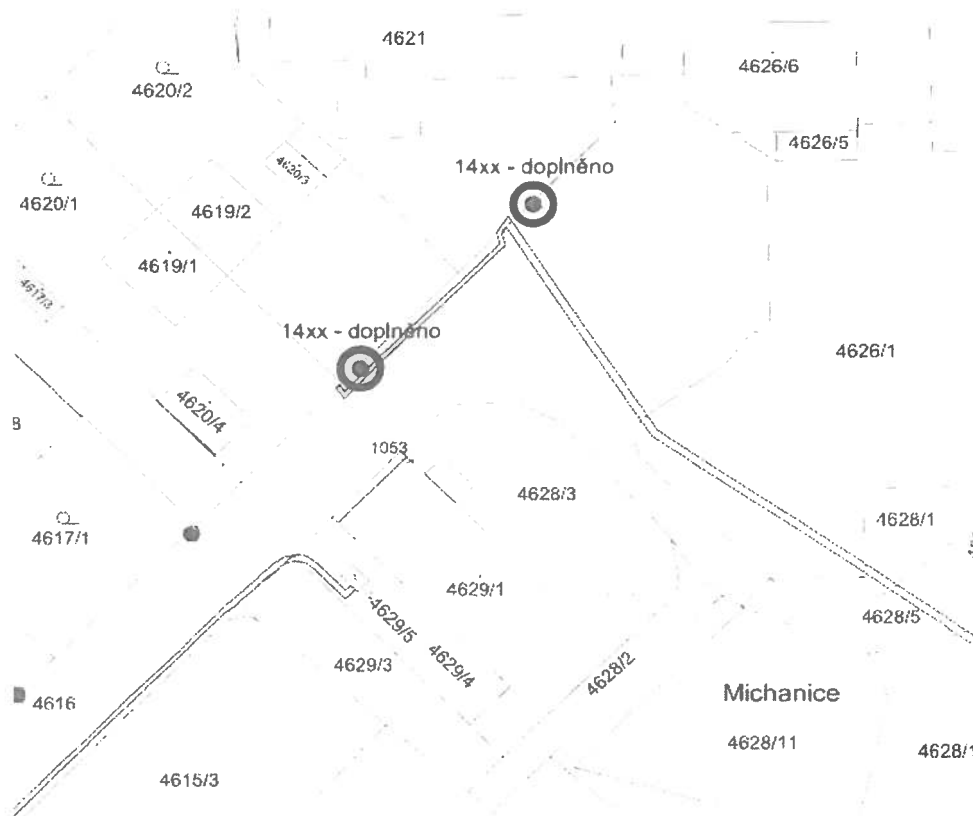


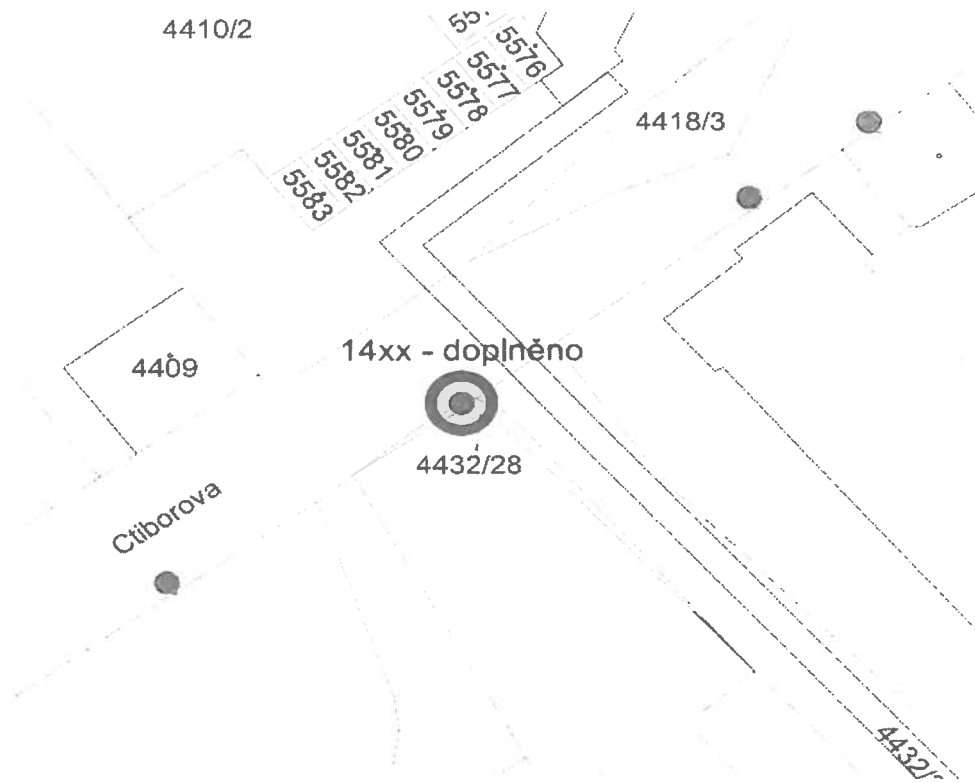

Lokalita č.3 ul.Dukelská - Veterinární klinika

5 ks lamp

důvod změny: Chybějící světelný bod, kolize se stávajícím betonovým základem (2,7 m3) a betonovým krytem s podkladním ložem z kameniva (37,7 m2)

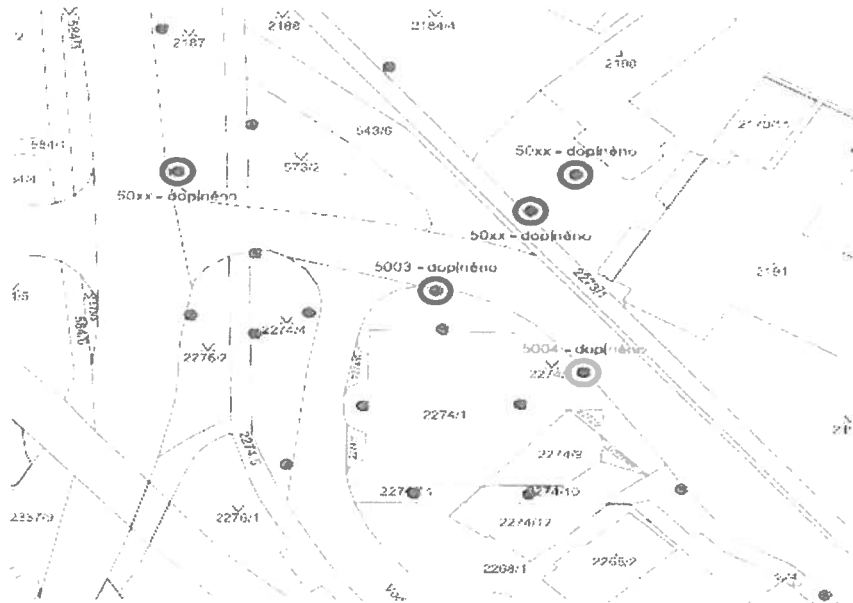

| Č                       | Kód          | Zkrácený popis / Varianta<br>Rozměry  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |            | Celkem    | Cenová<br>soustava |               |               |
|-------------------------|--------------|---|----------|-----------------|--------------|------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|
|                         |              |   |          |                 | Dodávka      | Montáž     |           |                    |               |               |
|                         |              |   |          |                 |              |            |           |                    | Objednatel:   |               |
| VO Dukelská - ZMĚNA Č.1 |              | Doba výstavby:  |          |                 |              |            |           |                    |               |               |
| <b>M22</b>              |              |   |          |                 |              |            |           |                    |               |               |
| 5                       | 210204011RS2 | Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m<br>Varianta: včetně nákladů na autojeřáb   | kus      | 8,00            | 2 600,00     | 0,00       | 20 800,00 | 224 062,12         | 20 800,00     | RTS I / 2022  |
| 6                       | 31673551     | Stožár osvětlovací uliční U 9-159/133/114<br>RTS komentář: Osvětlovací stožár bezpaticový - uliční třístupňový U9 * cena: základní nátěr ** cena r. 2007 žárový zinek TYPY VÝLOŽNÍKŮ: J, UD jednoramenné, dvojamenné s vyložním do 3000 mm J, UD tříramenné, čtyřramenné s vyložním do 1500 mm POUŽITÍ: osvětlení větších prostor hlavních městských komunikací POVRCHOVÁ ÚPRAVA: žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461 metalizace Zn+Al v min. tloušťce 160 mikronů nátěr základní barvou nátěry dle barevného odstínu tabulek barev RAL PROVEDENÍ: spodní část dřívku je opatřena otvorem s dřívky pro montáž svorkovnice v ose dřívku jsou dva profílehlé oválné otvory pro průchod kabelů. OSTATNÍ NABÍDKA: stožárová výzbroj svítidla se zdrojem POUŽITÉ MATERIÁLY: ocelové svařované a bezešvé trubky ČSN 11343, 11353, 11373 výrobek odpovídá normě ČSN - EN 40 | kus      | 8,00            | 17 240,47    | 137 923,76 | 0,00      | 137 923,76         | 137 923,76    | RTS I / 2022  |
| 9                       | 650106462R00 | Montáž elektrovyzbroje stožáru pro 2 okruhy   | kus      | 8,00            | 90,00        | 0,00       | 720,00    | 720,00             | RTS I / 2022  |               |
| 10                      | 22812VD      | Stožárová výzbroj   | ks       | 8,00            | 441,08       | 3 528,64   | 0,00      | 3 528,64           | 3 528,64      | RTS I / 2022  |
| 11                      | 210204103RS2 | Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg<br>Varianta: včetně nákladů na montážní plošinu  | kus      | 8,00            | 250,00       | 0,00       | 2 000,00  | 2 000,00           | RTS I / 2022  |               |
| 13                      | 22026VD      | Výložník obloukový jednoramenný, 1,5m, sklon 15st., žárově zinkovaný  | ks       | 8,00            | 2 755,71     | 22 045,68  | 0,00      | 22 045,68          | 22 045,68     | RTS I / 2022  |
| 17                      | 210202110R00 | Svítlidlo veřejného osvětlení ramenové  | kus      | 2,00            | 300,00       | 0,00       | 600,00    | 600,00             | RTS I / 2022  |               |
| 19                      | 22809VD      | LED svítidlo 1x30W, 2700K, IP65, IK10   | ks       | 2,00            | 11 554,34    | 23 108,68  | 0,00      | 23 108,68          | 23 108,68     | RTS I / 2022  |
| 22                      | 210204123R00 | Patice stožárová sklolaminátová   | kus      | 8,00            | 150,00       | 0,00       | 1 200,00  | 1 200,00           | RTS I / 2022  |               |
| 23                      | 31679102     | Patice stožárová PP1000/145   | kus      | 8,00            | 880,00       | 7 040,00   | 0,00      | 7 040,00           | 7 040,00      | RTS I / 2022  |
| 25                      | 210810005RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený<br>Varianta: včetně dodávky kabelu   | m        | 96,00           | 44,41        | 1 854,89   | 2 408,47  | 4 263,36           | RTS I / 2022  |               |
| 28                      | 210100064R00 | Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 16 mm2  | kus      | 68,00           | 8,00         | 0,00       | 544,00    | 544,00             | RTS I / 2022  |               |
| 29                      | 210100060R00 | Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 2,5 mm2   | kus      | 48,00           | 6,00         | 0,00       | 288,00    | 288,00             | RTS I / 2022  |               |
| <b>M23</b>              |              |   |          |                 |              |            |           |                    |               |               |
| 31                      | 210220022RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZr, D 8 - 10 mm<br>Varianta: včetně drátu FeZn 10 mm   | m        | 16,00           | 101,06       | 606,46     | 2 290,50  | 2 896,96           | 1 616,96      | RTS II / 2020 |
| 32                      | 210220010R00 | Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2  | m        | 8,00            | 40,00        | 0,00       | 320,00    | 320,00             | RTS II / 2019 |               |
| 33                      | 210220302R00 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/<br>Zemní práce při montážích   | kus      | 16,00           | 60,00        | 0,00       | 960,00    | 960,00             | RTS II / 2020 |               |
| <b>M24</b>              |              |   |          |                 |              |            |           |                    |               |               |
| N                       | 460131113    | Hloubení nezapažených jam, ručně, třída I, skupina 3  | m3       | 12,40           | 1 130,00     | 0,00       | 14 012,00 | 14 012,00          | URS 2023/1    |               |
| 41                      | 460080001R00 | Betonový základ do zeminy bez bednění   | m3       | 6,80            | 3 350,00     | 13 064,51  | 9 715,49  | 22 780,00          | RTS I / 2022  |               |
| N                       | 460391123    | Zásyp jam ručně, třída I, skupina 3   | m3       | 5,60            | 297,00       | 0,00       | 1 663,20  | 1 663,20           | RTS I / 2022  |               |
| N                       | 468011122    | Odrtranění podkladu z kameniva drčeného, tl.přes 10 do 20 cm  | m2       | 45,20           | 258,00       | 0,00       | 11 661,60 | 11 661,60          | URS 2023/1    |               |
| N                       | 468011132    | Odrtranění podkladu z betonu prostého, tl.přes 15 do 30 cm  | m2       | 45,20           | 728,00       | 0,00       | 32 905,60 | 32 905,60          | URS 2023/1    |               |
| N                       | 468051131    | Bourání základu železobetonového  | m3       | 3,90            | 6 500,00     | 0,00       | 25 350,00 | 25 350,00          | URS 2023/1    |               |
| <b>M25</b>              |              |   |          |                 |              |            |           |                    |               |               |
| 43                      | 979081111R00 | Doprava hmot, přeneseny sutí  | t        | 37,35           | 180,00       | 0,00       | 14 731,34 | 14 731,34          | RTS I / 2022  |               |
| 44                      | 979081121R00 | Odvoz sutí a výbour hmot na skládku do 1 km   | t        | 336,18          | 7,90         | 0,00       | 6 723,54  | 6 723,54           | RTS I / 2022  |               |
| 45                      | 460600001RT8 | Příplatek k odvozu za každý další 1km   | m3       | 5,60            | 420,00       | 0,00       | 2 655,80  | 2 655,80           | RTS I / 2022  |               |
| 47                      | 97902VD      | Naložení a odvoz zeminy<br>Pronájem zdvihací plošiny  | den      | 2,00            | 1 500,00     | 0,00       | 3 000,00  | 3 000,00           | RTS I / 2022  |               |

**CELKOVÁ CENA - ZMĚNA Č.1**

**350 062,82 Kč**

pozn. položka s číselnou hodnotou ve sloupci č. je položka z SOD a položka s pořadovým číslem N - není součástí SOD



ABC Chomutov, spol. s r.o. (řic)  
430 01 Chomutov, Škroupova 1059

Ing. Petr Mlýňko, ředitel stavby

# Vyjádření autorského dozoru projektanta

Pro stavbu: **Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Ctiborova, Vodní a přilehlých prostor ve městě Chomutov**

Objednatel: **Statutární město Chomutov, IČO:00261891**

Zhotovitel: **ABC Chomutov spol. s r.o., IČO:44566760**

Projektant: **Libor Slavík, 04351789**

Číslo/označení smlouvy: **d202200418**

Souhlasím s oznámenou změnou , o drobných změnách pozic stožárů, jejich počtu a z toho vyplívající změna v počtu svítidel.

V Chomutově dne . 16. 1. 2023



.....

.....

Libor Slavík
